


官方任务如何落到临时场地

6项任务 · 13维审查 · 1条公共版本脊 · 3座原型 · 2个接口 · 6份交付合同

百年京张文化带

都市AI生活体验带

AI融合创新带

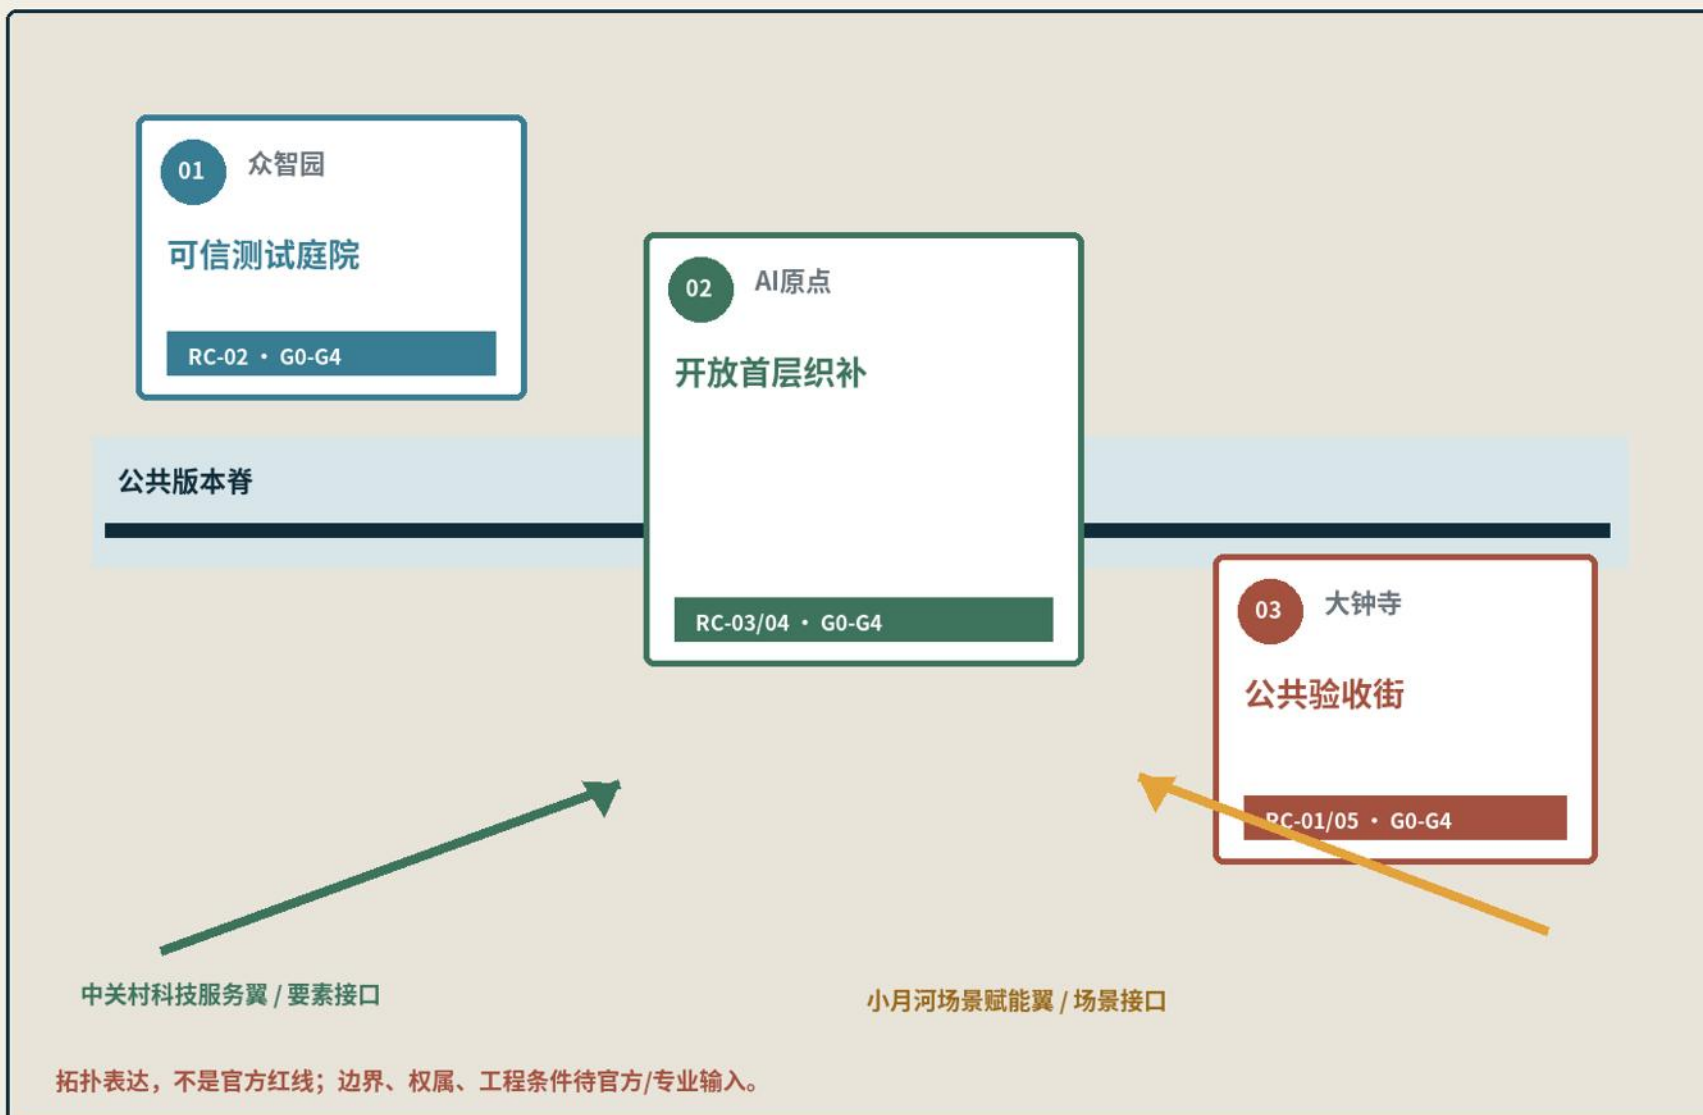

6项官方任务 → 空间载体 → 交付证据

1	总体统筹 一脊+三原型	RC-06
2	创新生态 众智园+原点	RC-02/03
3	AI+场景 场景翼+验收街	RC-01/04/05
4	空间地标 公园+三地标	RC-01/02/03
5	文化叙事 版本脊+导视	RC-06
6	长期运营 三场+两接口	G3/G4

现实状态: 未授权 · 未实测 · 未现场运行

从任务书到专业交接： 每一步都有去向

任务 → 空间载体 → RC合同 / G0-G4 → 可核验工件； 导航不替代原始证据

官方任务	空间载体	交付门	首要证据
01 总体统筹	一脊 · 三原型 · 两接口	RC-06 / G0,G4	site-overview + brand-system
02 创新生态	众智园 · AI原点 · 服务翼	RC-02/03 / G1,G2	ecosystem-map + contracts
03 AI+场景	场景翼 · 公共路径 · 验收街	RC-01/04/05 / G2,G3	12 scenario contracts + governance
04 公共空间地标	遗址公园接口 · 三可逆地标	RC-01/02/03 / G1,G4	landmark library + constraints
05 文化叙事	版本脊 · 来源导视 · 空间序列	RC-06 / G0,G4	culture matrix + bilingual copy
06 长期运营	三场地 · 两接口 · 发布日历	RC-01/05/06 / G3,G4	conversion funnel + close-out

13个官方评审维度

- 目标
- 功能
- 品牌
- 协同
- 规划
- 产业
- 场景
- 空间
- 转化
- 表达
- 合规
- 国际
- 运营

边界：这是任务追踪与专业交接索引；所有现实授权、机构、实测、预算和绩效仍为空。

12个AI场景如何进入专业复核

空间 · 最小数据 · 人工终责 · RC合同 · G1/G2角色 · 停止与恢复

S01开源发布厅RC-06 空间 AI原点成果街与开放首层 数据 主动项目+逐资产权利 人工 策展终审 复核 G1 空间/专业 + G2 控制/独立 停止 许可/署名不明 现值=空 · 机构=未确认 · 现场=0

矩阵只开放 G1/G2 案头复核；实测容量、授权和专业签认缺失，G3现场试点关闭。

G3之前：10个可委托、可验收、可否决的工作包

T0规则完成 · T1委托书完成 · T2外部专业工作未启动 · T3现场关闭

资料与责任	空间合规	系统与容量	公共与成本	运营与关门
C01边界/资料请求 委托书 参与者侧已完成 验收对象 来源 · 权利 · CRS · 复算 外部状态 未委任 · 未取证 否决 任一责任/证据/安全条件未闭合 可启动：委托范围确认；不可启动：现场/采购	C03权属/文保/轨道 委托书 参与者侧已完成 验收对象 清除 · 附条件 · 移动 · 取消 外部状态 未委任 · 未取证 否决 任一责任/证据/安全条件未闭合 可启动：委托范围确认；不可启动：现场/采购	C05市政/防洪/能源/网络 委托书 参与者侧已完成 验收对象 容量 · 隔离 · 维护 · 降级 外部状态 未委任 · 未取证 否决 任一责任/证据/安全条件未闭合 可启动：委托范围确认；不可启动：现场/采购	C07公共利益/经同意共测 委托书 参与者侧已完成 验收对象 12任务 · 3类需求 · 退出 · 复测 外部状态 未委任 · 未取证 否决 任一责任/证据/安全条件未闭合 可启动：委托范围确认；不可启动：现场/采购	C09采购/保险/运营/接口 委托书 参与者侧已完成 验收对象 责任 · 资源 · 投诉 · 五方确认 外部状态 未委任 · 未取证 否决 任一责任/证据/安全条件未闭合 可启动：委托范围确认；不可启动：现场/采购
C02机构/授权确认 委托书 参与者侧已完成 验收对象 委任 · 暂停权 · 替补 · 责任 外部状态 未委任 · 未取证 否决 任一责任/证据/安全条件未闭合 可启动：委托范围确认；不可启动：现场/采购	C04实测/消防/无障碍/人流 委托书 参与者侧已完成 验收对象 宽度 · 标高 · 疏散 · 绕行 外部状态 未委任 · 未取证 否决 任一责任/证据/安全条件未闭合 可启动：委托范围确认；不可启动：现场/采购	C06数据/隐私/AI安全 委托书 参与者侧已完成 验收对象 最小化 · 人工终责 · 事故 · 删除 外部状态 未委任 · 未取证 否决 任一责任/证据/安全条件未闭合 可启动：委托范围确认；不可启动：现场/采购	C08工程量/规格/全周期成本 委托书 参与者侧已完成 验收对象 两份询价 · 运维 · 撤除 · 恢复 外部状态 未委任 · 未取证 否决 任一责任/证据/安全条件未闭合 可启动：委托范围确认；不可启动：现场/采购	C10综合Go/No-Go与G2演练 委托书 参与者侧已完成 验收对象 关问题 · 六RC演练 · 独立签认 外部状态 未委任 · 未取证 否决 任一责任/证据/安全条件未闭合 可启动：委托范围确认；不可启动：现场/采购

关键路径：C01 → C02 → C03/04/05 → C06/07 → C08/09 → C10 → 另行授权G3

十份委托书可供责任方确认范围；专业委任、实测、签认、预算、采购和现场工作仍为0。

实施证据：规则可复演，现实门仍关闭

24/24 合成案例 · 6通过/18拒绝/18暂停 · 0现场运行

24/24

规则匹配

18

拒绝/暂停

6

合成通过

0

现场运行

01

可执行合同

5个必需输入 + 事故状态
一致决定通过或暂停

包内已完成

02

工程量方法

对象 · 单位 · 测量依据
规格 · 询价证据

包内已完成

03

全周期成本

资本 · 运营 · 维护
撤除 · 场地恢复

包内已完成

04

现实放行

机构 · 授权 · 实测 · 预算
仍未确认，不可跳过

未启动

证据边界：桌面通过不等于现场放行；金额、机构、授权、实测、采购与绩效均未声明。

七维证据导航：先看结论，再下钻原始工件


官方规则为主 · 高分方法只作组织参照 · 每项指向可核文件

01	任务书	三层范围 / agent.1-6	proposal + compliance
02	原创	版本 / 测试 / 回滚	brand + key areas
03	AI规划	12场景合同	governance + contracts
04	实施	24复演 / 6成本法	receipts + cost method
05	包容	非数字 / 无障碍	accessibility QA
06	合规	来源 / 权利 / 状态	sources + rights
07	表达	双语 / HTML / A3-A0	bilingual QA

实施证据最短路径：implementation-readiness.png → rc-tabletop/receipts.json → quantity_cost_method.json

一个符号，四种可执行的城市触点

RAIL · OPEN BRACKET · VERSION NODE · NOTICE / HUMAN / STOP / ARCHIVE



轨道 + 开放括号 + 版本节点

遗产连续 | 允许质询 | 责任可追 | 失败可退

RAILCODE COMMONS

轨道源场



01

知情牌

目的 / 数据 / 责任 / 时段



02

人工入口

基本服务不以账户为门槛



03

实体急停

现场可见、演练、留痕



04

贡献档案

版本 / 许可 / 撤回 / 复盘

原创组合标志 · 横排/竖排/单色 · 最小宽24mm / 120px


Noto Sans SC · SIL OFL 1.1 · 非官方品牌 / 非注册商标

案例不是模板，八要素必须变成责任合同

6 TRANSFER TESTS • 8 ACCOUNTABILITY CONTRACTS • NO INSTITUTIONAL CLAIMS



只迁移机制；不迁移绩效数字、土地制度、资金承诺或机构背书

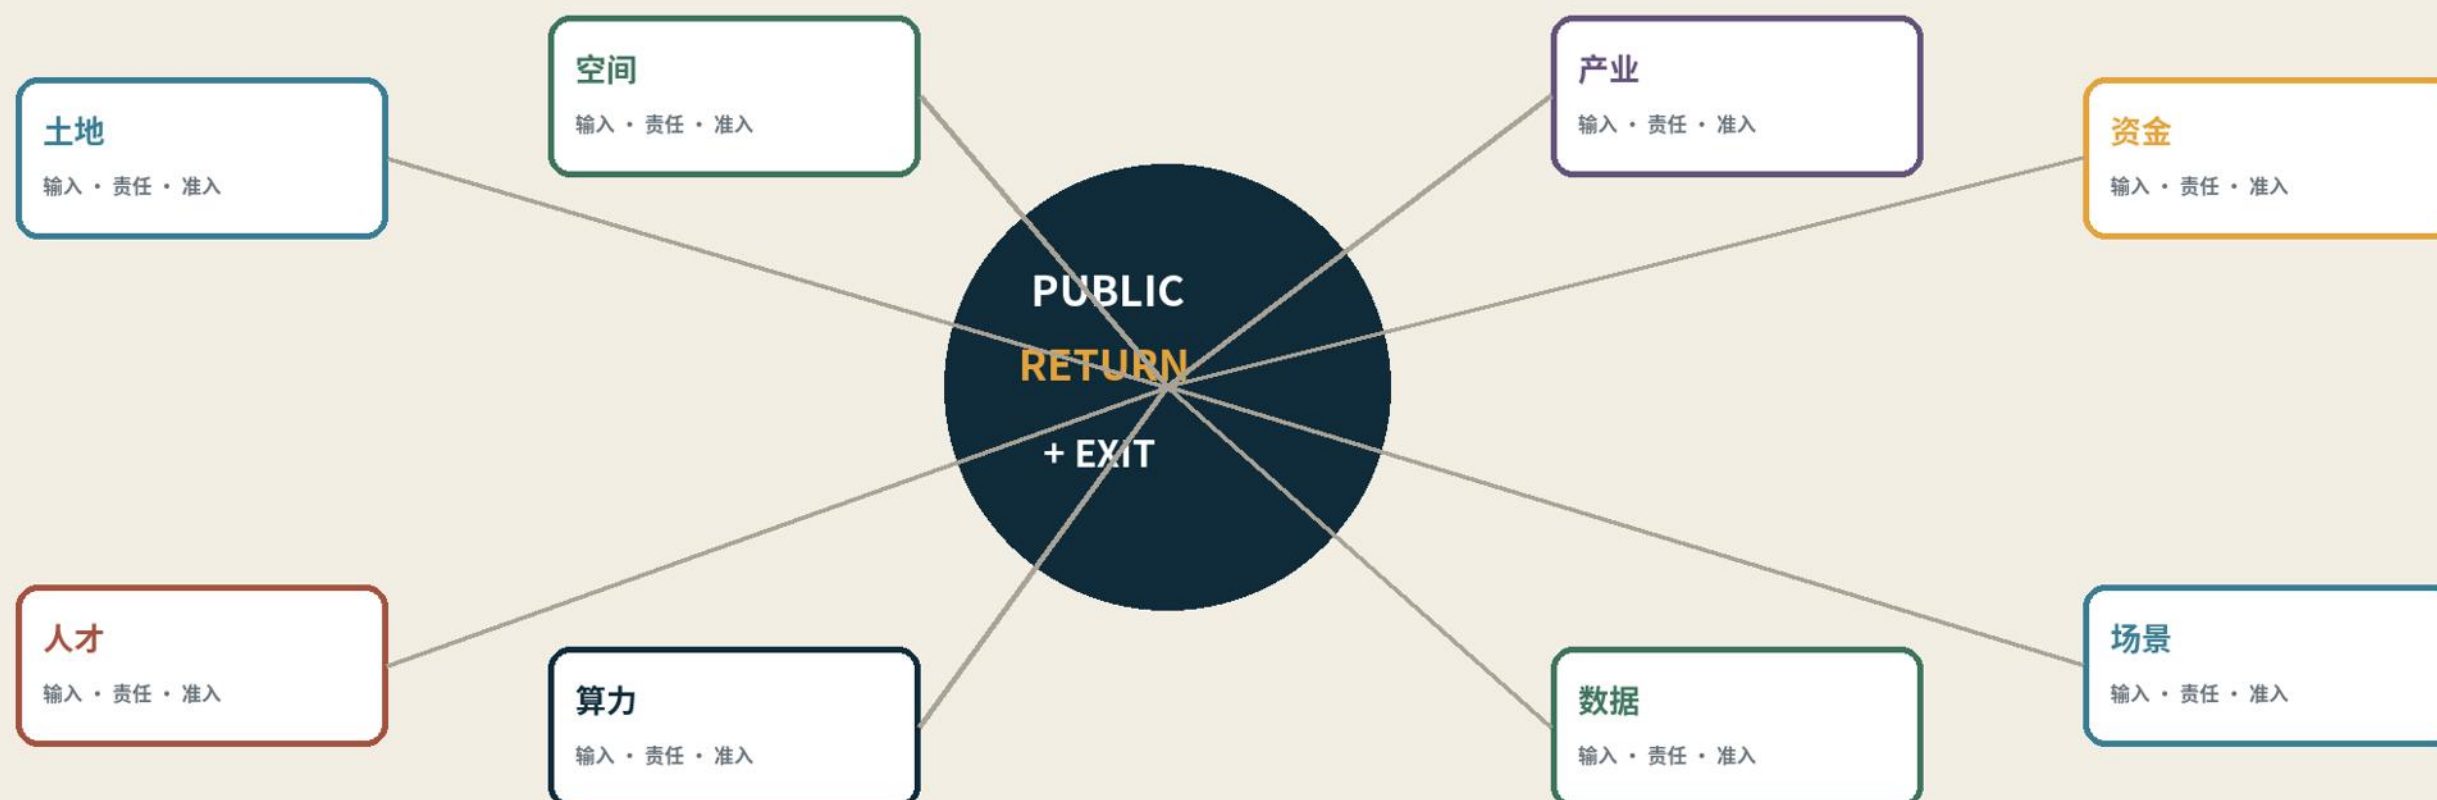

三重点区专业交接：空间、责任、暂停与恢复

每区4步空间序列 · RC合同 · G0-G4 · 角色类型 · 进入证据 · 退出回执

众智园

可信测试庭院

RC-02 · G0-G4



责任角色 权利方 / 安全测试 / 消防无障碍 / 公众观察

进入证据 边界实测 · 停止演练 · 无障碍绕行

暂停条件 安全、权属、绕行、责任或事故关闭任一失败

恢复证据 纠正方案 + 双人签认 + 新停止回执

现实状态：未授权 / 未实测 / 未现场运行

AI原点

开放首层织补

RC-03/04 · G0-G4



责任角色 权利方 / 消防无障碍 / 运营 / 慢行审计

进入证据 开放授权 · 消防疏散 · 连续无障碍

暂停条件 无障碍、疏散、服务或运营责任任一失效

恢复证据 整改复核 + 路线复测 + 更新告知

现实状态：未授权 / 未实测 / 未现场运行

大钟寺

公共验收街

RC-01/05 · G0-G4



责任角色 权利方 / 服务责任 / 隐私数据 / 公共利益

进入证据 纸本优先 · 无账号通路 · 人工升级

暂停条件 人工通路、同意、投诉、安全或隐私任一失败

恢复证据 恢复人工通路 + 事故关闭 + 撤回复演


现实状态：未授权 / 未实测 / 未现场运行

朝圣地标不是巨构，而是让责任可见的公共学习设施

TRUST OBSERVATION RING · OPEN VERSION ZERO · PUBLIC ACCEPTANCE TABLE

众智园


可信观察环

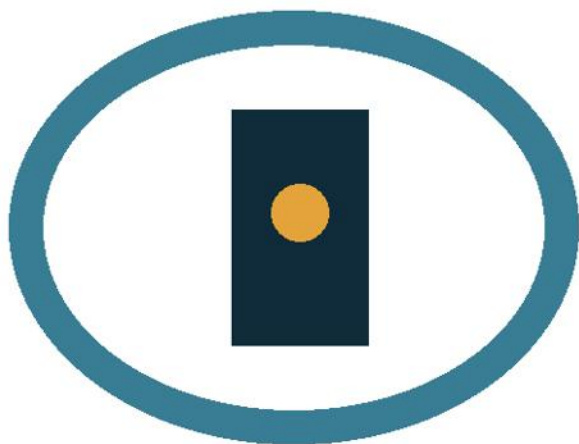

可逆 · 无障碍 · 唯一维护责任 · 可停用

AI 原点


开源版本原点

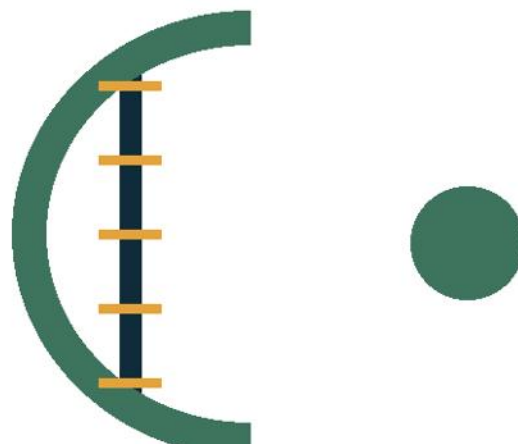

可逆 · 无障碍 · 唯一维护责任 · 可停用

大钟寺

公共验收长桌



可逆 · 无障碍 · 唯一维护责任 · 可停用



知情牌



人工入口



实体急停



贡献档案

AI治理不是黑箱，是一条可回滚路径

输入—处理—人工—公共验收—暂停/回滚



01 100% 激活前告知

02 100% 高影响人工终决

03 0 默认人脸/连续轨迹

04 ≤30秒转人工

05 1日确认/5日目标答复

06 0 严重安全事件

同一条脊梁，五层基础设施互不混权

HERITAGE • WALK/CYCLE • BLUE-GREEN • SERVICE STACK • HUMAN FALLBACK



断网可用



人工窗口



纸质导视



不连续跟踪




设备可撤


遗产轨迹




步行/骑行



雨洪/树荫

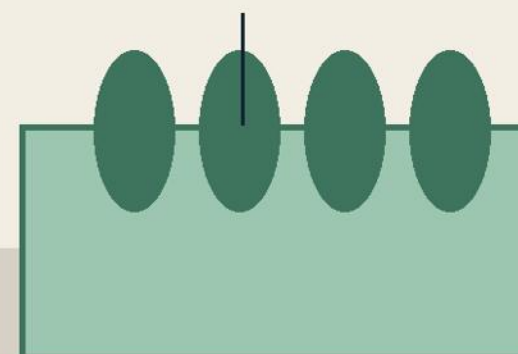

可检修栈



CONCEPT SECTION • DIMENSIONS AND CAPACITY REQUIRE PROFESSIONAL CONFIRMATION

90天不是倒计时，是五道可退出实施门

六份合同 · 每份唯一责任A角色 · L1/L2成本带



合同	位置	责任A	成本	停止条件
RC-01	大钟寺	场地运营者	L1-L2	任一红线KPI失败
RC-02	众智园	测试运营者	L2	严重事件/越界采集
RC-03	原点社区	物业/园区	L1-L2	通行或消防受损
RC-04	三地接口	公共空间运营者	L1	基本通行不连续
RC-05	大钟寺	数据责任方	L1	撤回/删除不可执行
RC-06	三地	策展运营者	L1	来源许可不可核验

CONCEPT DELIVERY CONTRACTS · NOT APPROVED PROJECTS / INVESTMENT / SCHEDULES
