

总体空间结构与近期实施安排

组织近期项目和公共设施布局，形成一轴三片、两翼协同、十二节点的空间结构



近期建设重点：慢行示范、节点补缺、首层改造、站城衔接

以1公里慢行示范段、3处首期节点和3个重点片区项目为抓手，分期形成连续公共空间和便民服务网络。



0—1月：底图与权属

1—3月：项目准备与立项

4—24月：示范先行、滚动实施

总体工作台账

11.41 km²

总体设计工作底图

3

重点实施片区

6

近期建设项目包

0—24月

建议实施周期

近期管控要求

- 01 正式边界和权属先核
- 02 轨道安全和地下管线先审
- 03 公益设施与经营项目统筹
- 04 建设、运营和维护责任同步落实

重点实施片区与近期建设任务

三处重点片区分别建立项目清单和前置条件清单，分类安排更新方式与实施时序



存量空间改造示意

首层开放、无障碍通行、雨水调蓄和人工服务纳入同一改造项目。

重点片区项目台账

P-03 众智园创新验证片区

192.1 ha / 192.9 ha

创新验证场

权属准入·安全评估·交通消防

P-04 北京 AI 原点社区协同创新片区

104.3 ha / 104.3 ha

共享首层计划

权属租约·结构消防·分时运营

P-02 大钟寺站城融合片区

72.0 ha / 72.0 ha

站城公共厅先导界面

客流疏散·轨道接口·产权协商

公告面积与底图复算差异均小于 0.5%；正式四至仍由后续法定成果确定。

公共人工智能服务项目审查要点

对十二项拟建服务逐项核对责任主体、人工办理、数据使用、停止权限、投诉处置和年度评估



十二项拟建服务清单

项目名称 | 建设位置 | 责任类型 | 人工办理

S01

AI素养互动空间

大钟寺·公共教育运营组

S02

多语言京张文化导览

张张沿线·文化内容运营组

S03

青年城市议题工作室

AI原点·社区高校联合工作组

S04

学习与职业辅助服务

AI原点·人才服务运营组

S05

跨代数字服务站

服务节点·属地公共运营组

S06

无障碍路线共绘

京张沿线·无障碍共画组

S07

儿童安全对话系统评测

众智团·伦理与安全评估组

S08

低速机器人通行测试

众智团·机器人安全测试组

S09

隐私保护学习工具测试

AI原点·教育技术共画组

S10

端侧离线与能耗测试

众智团·设施工程测试组

S11

设施运维实训

众智团·设施运维组

S12

AI服务信息公示与公众反馈

三处片区·项目治理与独立评估组

申报审查条件

01

责任单位和经费

02

人工或实体办理

03

必要数据及保存期限

04

个人信息保护

05

故障切换和应急处置

06

暂停和终止权限

07

收费、状态和投诉公示


08

运行记录和年度评估



功能分区、规模平衡与更新方式

按六类更新单元核算用地规模，分别明确保留改造、功能导入、设施补建和实施条件

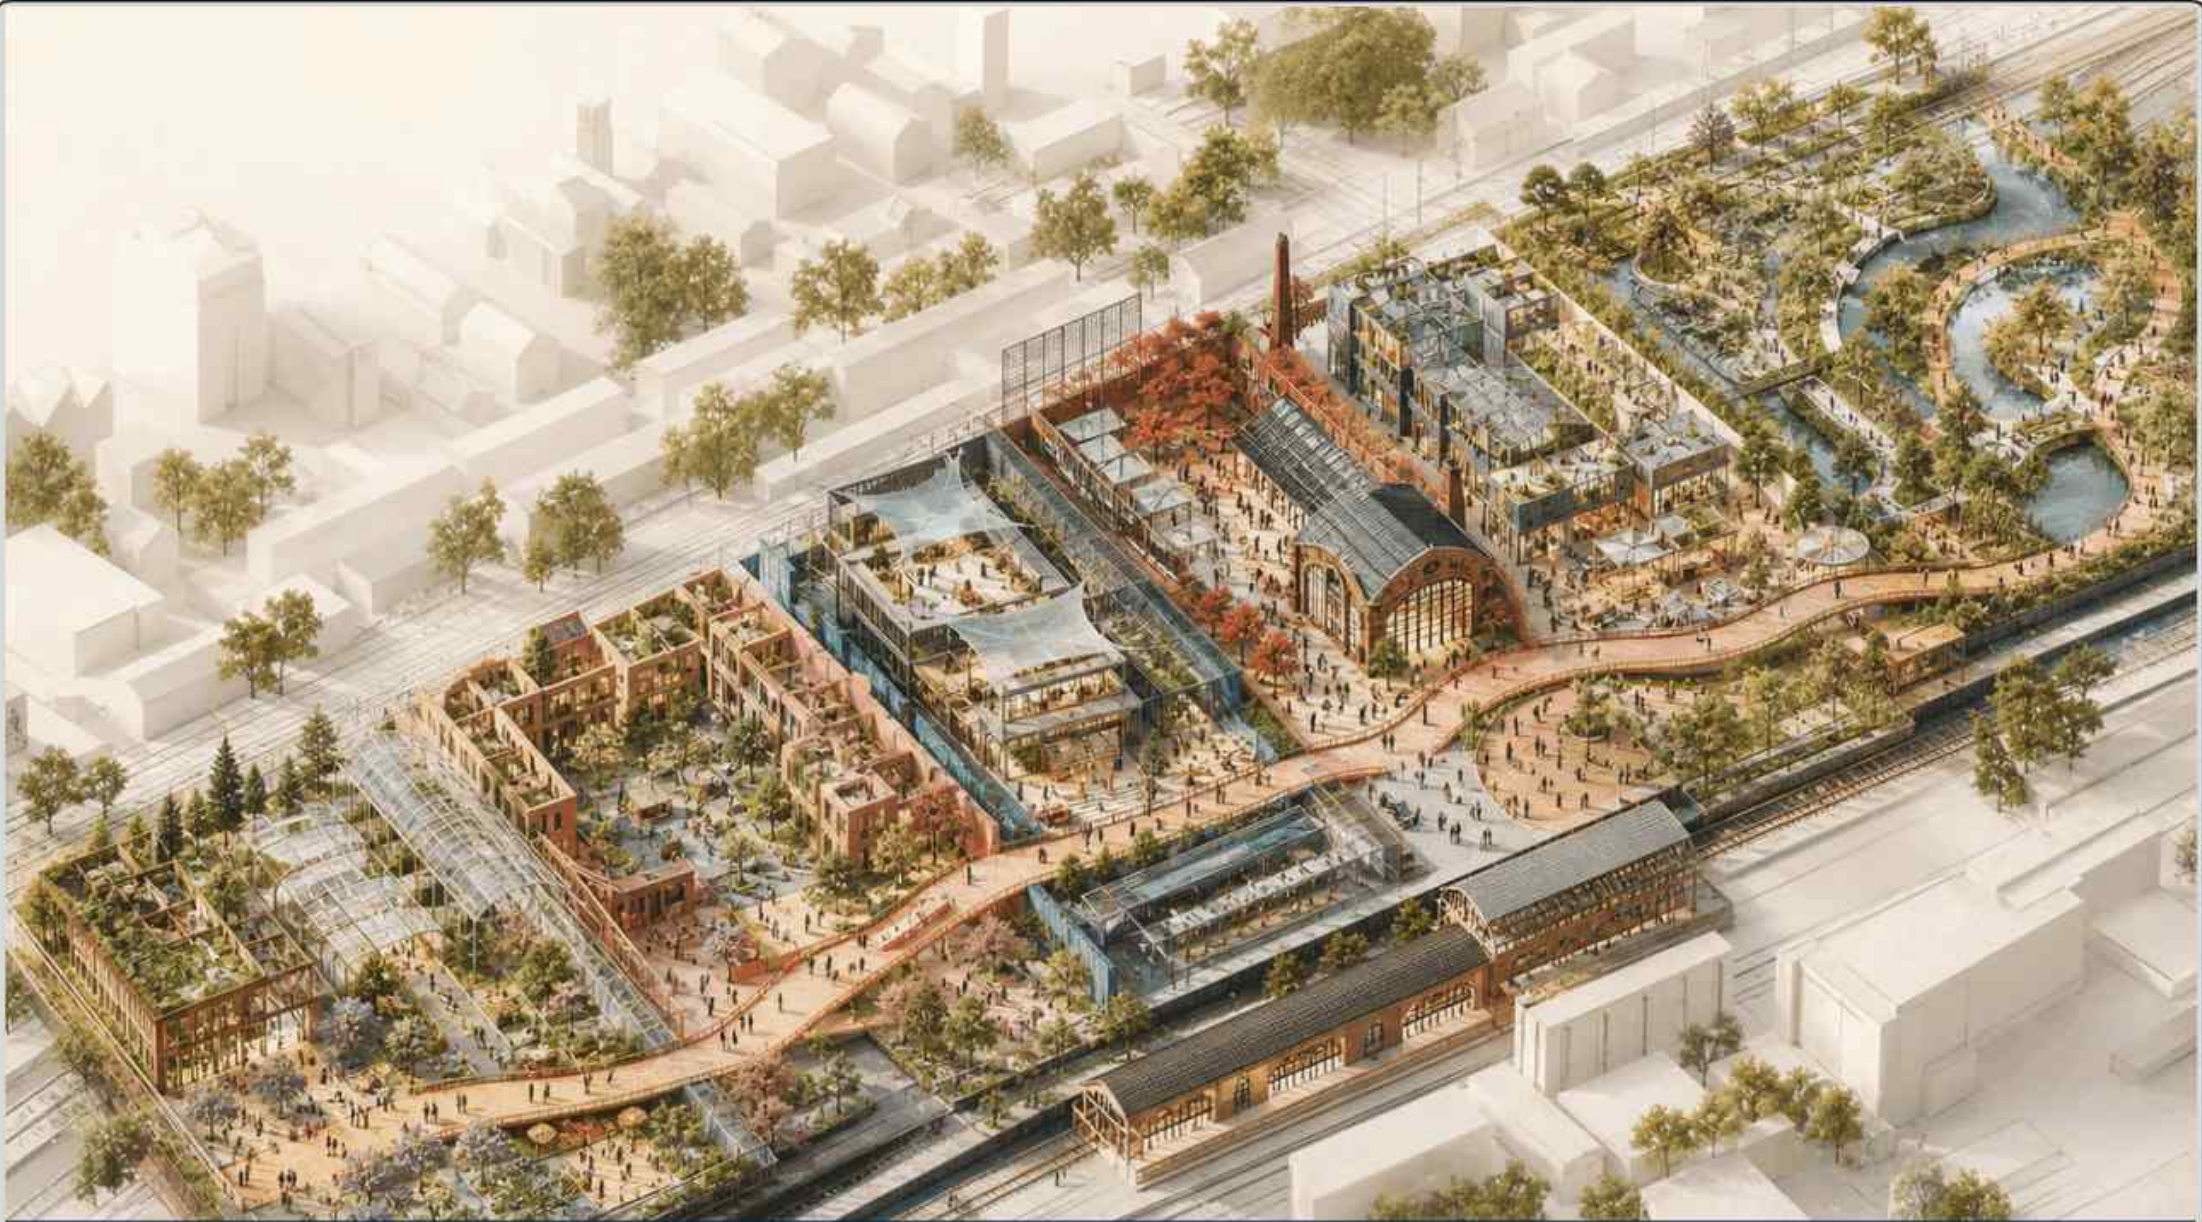

六类更新单元，分别确定建设任务和实施条件

分区用于项目统筹；法定用地性质、开发强度和兼容关系在实施方案中核定。

用地与任务台账

LU-01 研发测试与安全评估

208.6 ha - 18.3%

LU-02 人才居住与生活配套

214.4 ha - 18.8%

LU-03 教育培训与成果转化

204.9 ha - 17.9%

LU-04 铁路文化与公共服务

180.8 ha - 15.8%

LU-05 数字服务与商业配套

166.2 ha - 14.6%

LU-06 蓝绿空间与市政设施


166.4 ha - 14.6%

1141.3 ha

工作底图分区合计

慢行交通与雨洪设施近期建设要求

针对慢行断点、休憩不足和雨洪设施分散问题，统筹步行骑行、遮阴休憩、雨水调蓄和服务停留

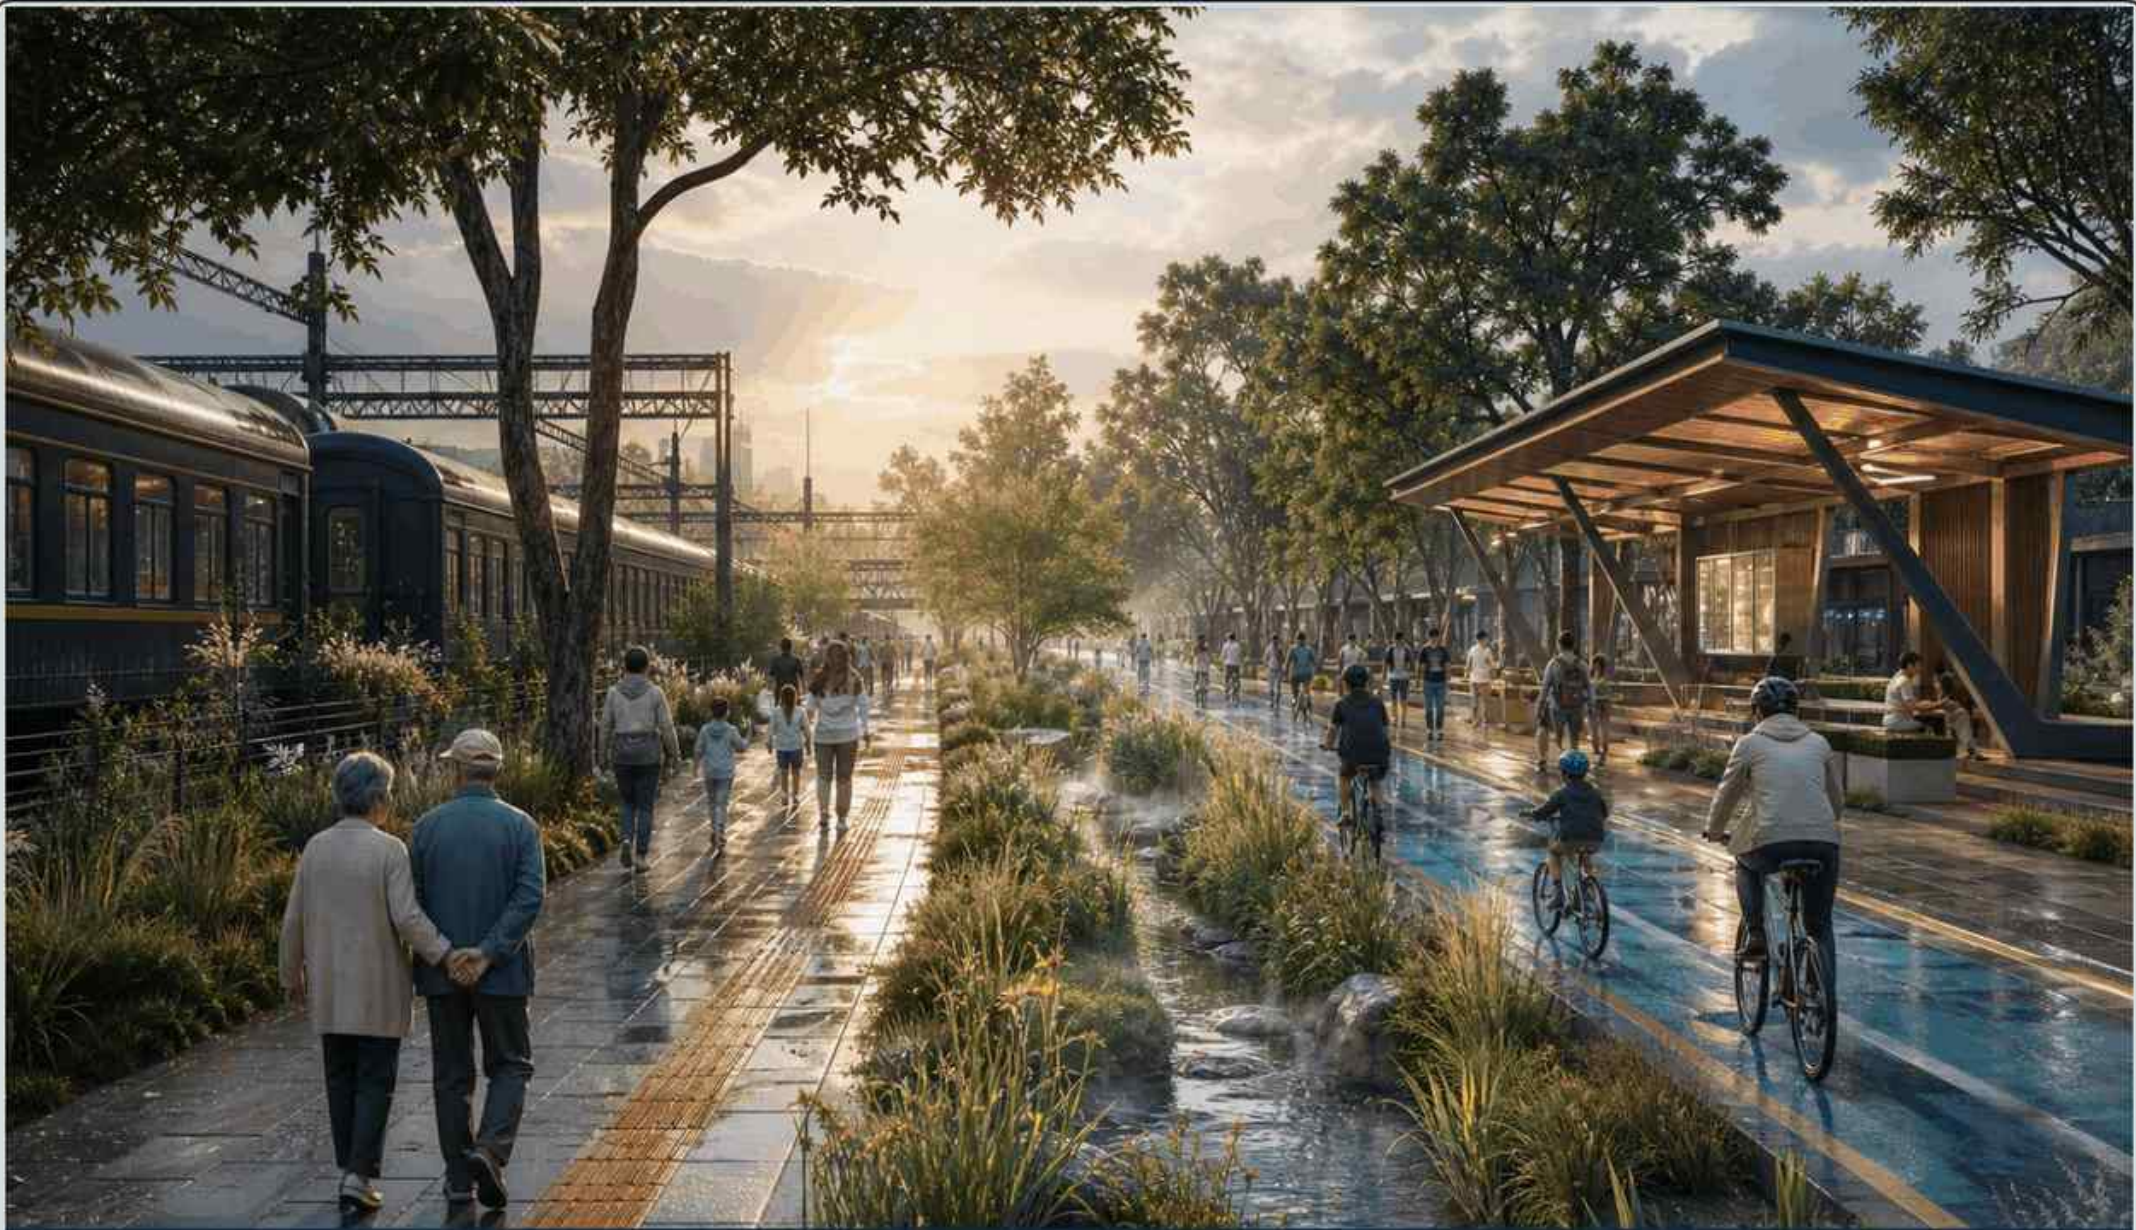

慢行示范段建成效果示意

步行、骑行、雨水设施和服务停留按12米典型断面统筹布置。

气候基线与空间响应

35.58°C 日最高温 P95

22.3 d/y ≥35°C 日数

649.1 mm 年均降水

4.05 日太阳辐射

12 m 弹性界面




步行	雨水	骑行	服务
3.0 m	2.5 m	4.0 m	2.5 m

连续净宽·汇水退水·遮阴休憩

规划指标分级管理与验收要求

将九项指标分为基础复算、设计控制和运营考核，逐项明确测量阶段、责任类型和复核周期

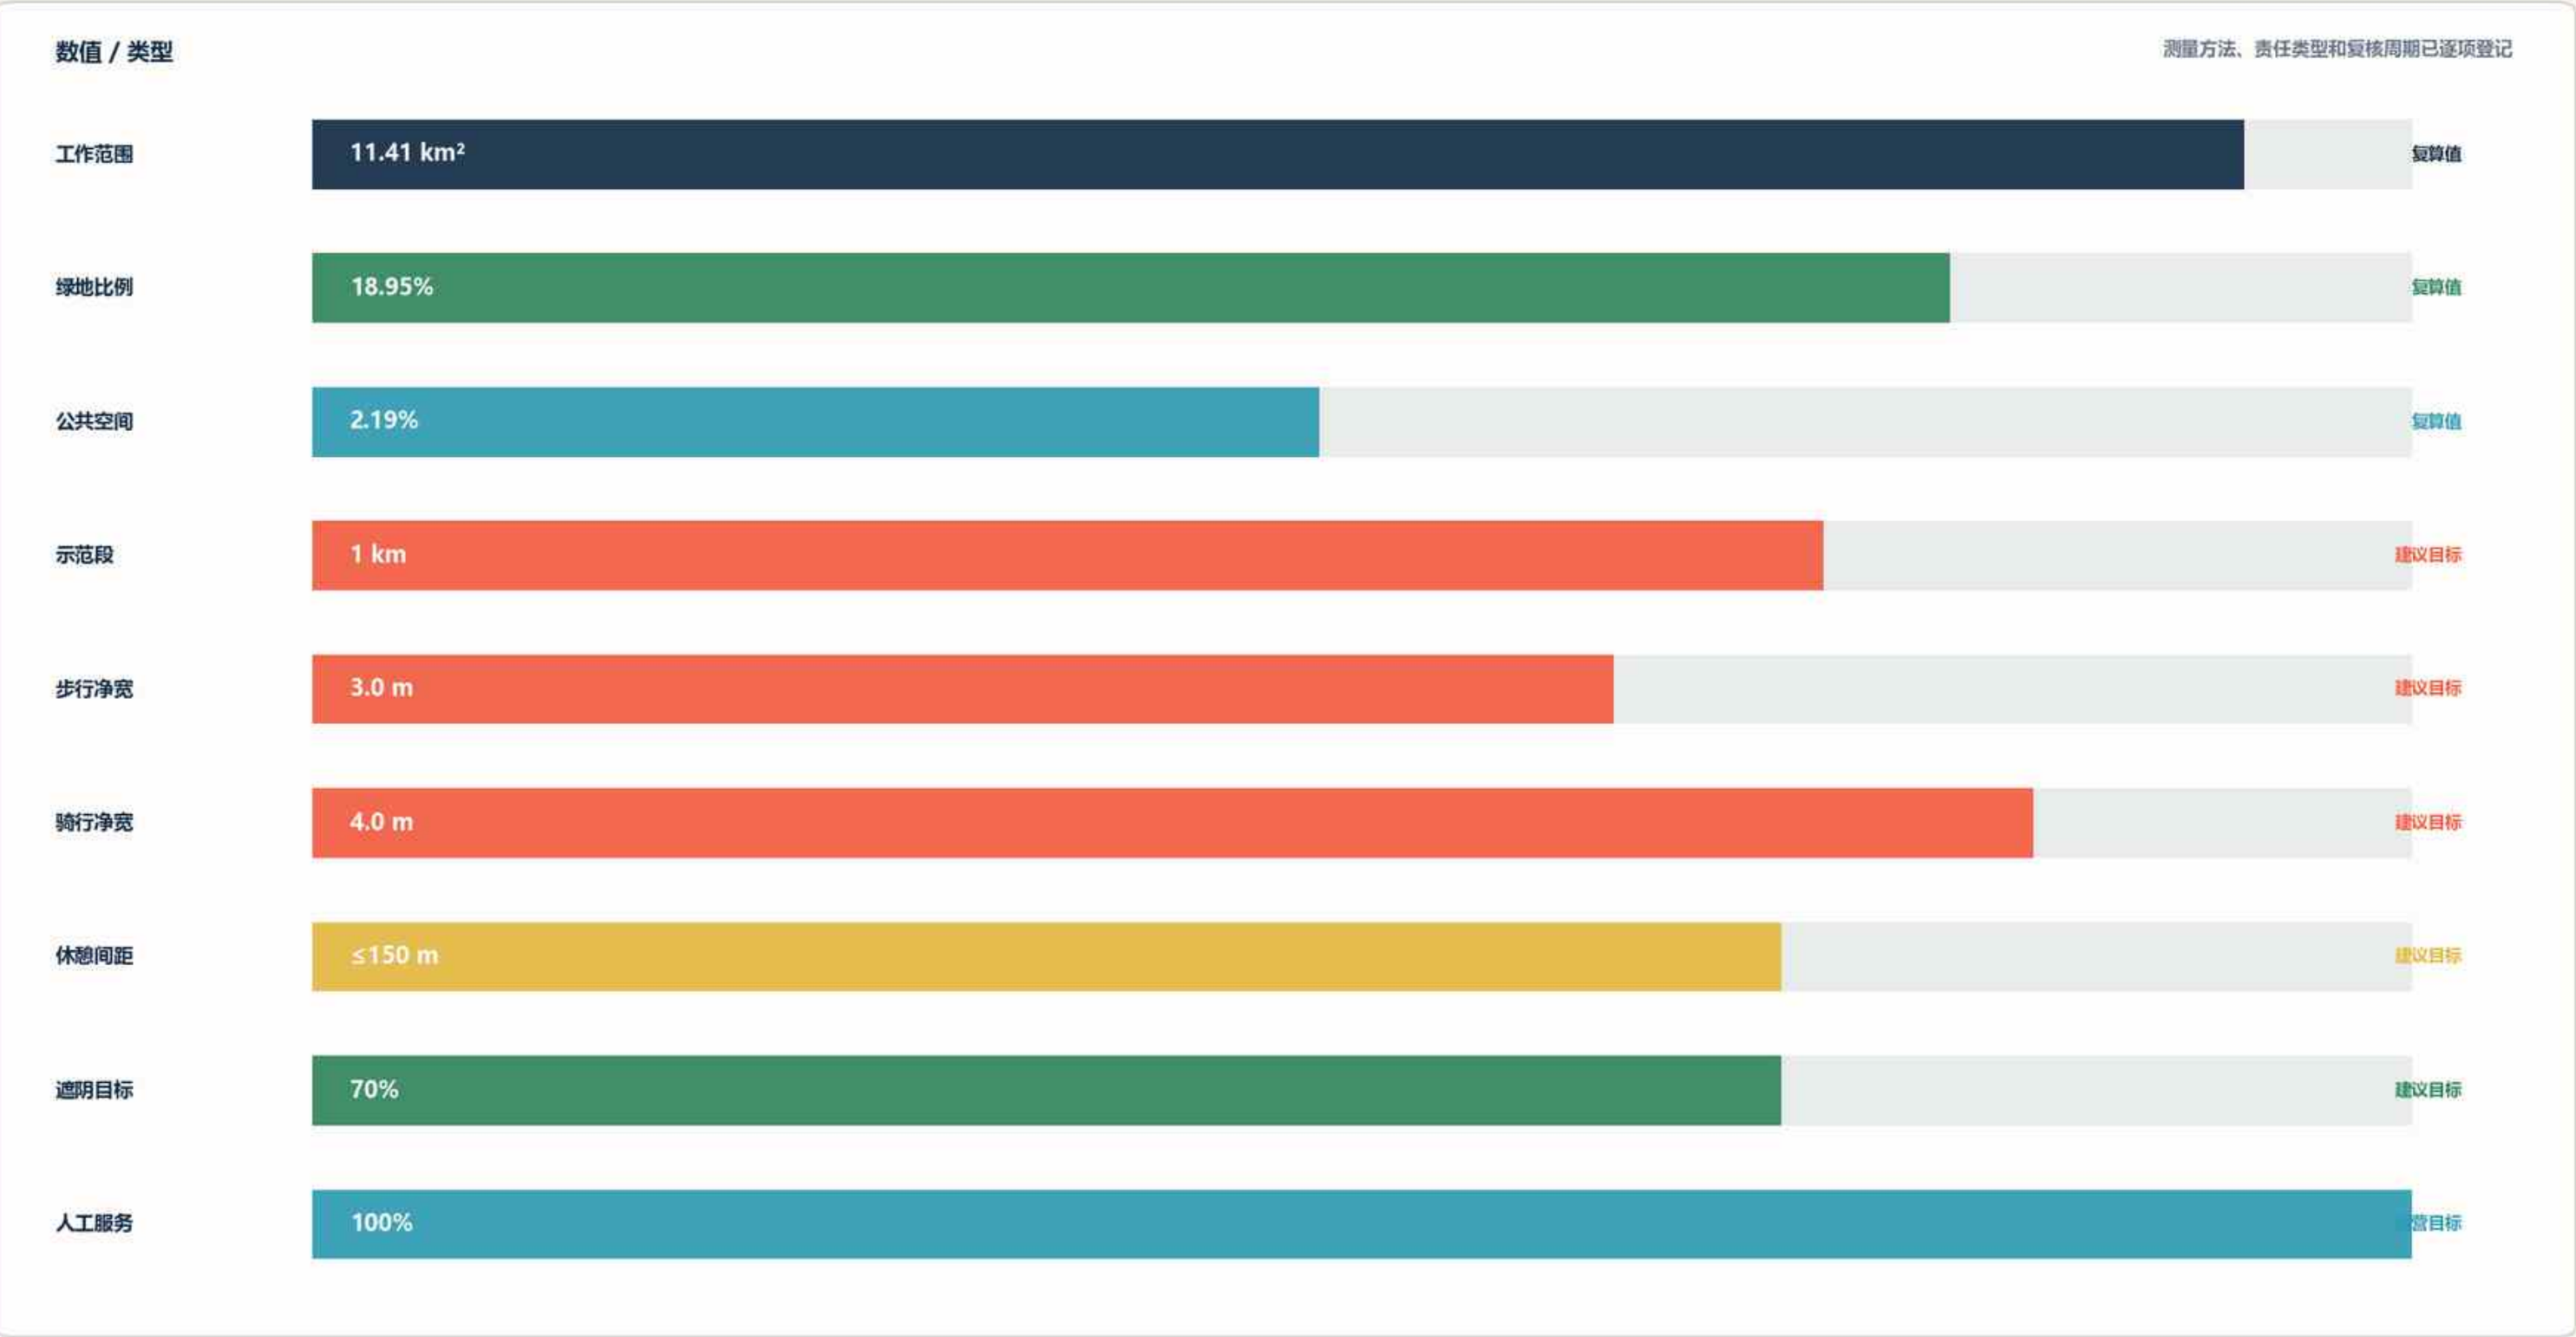

重点人群服务需求与项目整改清单

项目立项前开展重点人群走查，形成问题清单、整改责任表和意见反馈记录
重点人群问题登记频次 0—3

儿童与家庭	3		2		3		
老年人与照护者	1	3	3			1	
残障使用者	3		1		1	2	
长期居民			1		3	1	
租户与小微经营者	1		1	3	3	1	
学生与青年人才			3	3		1	
通勤者与访客	3				1		
一线服务与维护人员			1	2		1	
周边高校、园区与公共机构				1	2	1	
	通行	停留照护	人工服务	学习就业	施工负担	数据数字	维护接管

调查与处置安排

9类

重点人群调查

6项

参与和反馈环节

1套

问题整改责任表

覆盖率在分时客流、常住与就业
人口基数补齐后核算；当前按分组
需求和问题清单推进整改。

近期建设项目库与实施条件

六个近期项目包逐项落实建设内容、前置手续、资金安排、实施周期、验收要求和运营责任

六个近期项目管理卡

建设内容 | 建议责任类型 | 实施窗口 | 前置手续 | 交付成果

P-01 京张沿线慢行示范段

建设：1公里步行骑行，雨水及休憩设施

责任：区级统筹、属地街道、产权单位

工期：6-18个月 | M

先办：正式红线和权属界面，综合交通及轨道安全意见

P-02 大钟寺站城衔接先导项目

建设：四向步行、导向、服务点和停车整治

责任：属地街道、站区运营、交通专业单位

工期：12-24个月 | L

先办：客流与疏散专项，轨道接口书面意见

P-03 众智园研发测试场

建设：1.5公顷研发测试，安全缓冲及运维培训

责任：园区运营、高校和企业测试方、独立安全评估

工期：12-24个月 | L

先办：场地权属，项目准入

P-04 AI 原点社区共享首层

建设：3000平方米学习、人才服务和共享工作

责任：产权单位、属地街道、高校和社区

工期：9-18个月 | M

先办：权属和租约，网络安全和消防

P-05 公共服务节点样板

建设：320平方米人工服务、便民和雨水设施

责任：属地街道、社区、园林和设施运维

工期：6-12个月 | M

先办：地下管线复核，设施接入

P-06 公共人工智能服务管理系统

建设：项目申报、联合审查、工单和年度评估

责任：区级统筹、服务运营、独立评估

工期：3-9个月 | S

先办：数据分类、责任主体

资金与运营安排

01

公共空间和基本设施

纳入项目建设投资，明确资产接收和日常维护单位

02

经营及共享空间

产权单位与运营单位核算改造、租赁和人员费用

03

研发测试和数字服务

实施主体落实设备、保险、安全评估和系统维护费用

04

开工前资金条件

建设资金，年度运维经费和人员安排同步形成书面方案

投资级别：S < 500万 | M 500—2000万 | L 2000—5000万

京张沿线慢行示范段断面控制

针对步行断点、骑行混行、休憩不足和雨水排放问题，提出12米典型断面及验收要求



示范段建成效果 | 无障碍步行 + 雨水花园 + 双向骑行 + 人工服务

断面控制与验收要点

总宽12.0 m | 四类功能带连续衔接

01 步行通行 ≥3.0 m

净宽连续，盲道与缘石坡道顺接

验收：沿线净宽实测

02 雨洪调蓄 ≥2.5 m

汇水、溢流和排水路径完整

验收：专项计算 + 雨水检查

03 骑行通行 ≥4.0 m

双向组织，交叉口落实减速提示

验收：标线净宽 + 冲突点复核

04 服务停留 ≥2.5 m

配置座椅、遮阳和人工导向

验收：设施清单 + 无障碍核验

建设衔接

- 轨道保护范围与检修通道同步校核
- 道路红线、地下管线和现状树木一并统筹
- 停电断网期间保留实体导向和人工服务

公共服务节点建设与运营指引

以320平方米样板节点为例，明确用地、功能、人员、管线、验收和退出管理要求



节点轴测意向 | 20 m × 16 m | 连续无障碍闭环

节点建设与运营控制表

规划面积250—400 m² | 样板节点320 m²

01 空间规模 320 m²

20 m × 16 m 样板；采用可拆装构件

验收：用地与建成面积复核

02 人工服务 24—36 m²

配置窗口、等候、储物及值守席位

验收：开放时段与人员排班

03 环境品质 ≥70%

主要停留空间形成连续遮荫

验收：夏季日照分析与现场抽测

04 运行响应 60 s / 24 h

人工报警及时响应；常规故障报修

验收：月度响应和工单台账

交付与退出管理

- 管线综合、消防、无障碍和场地许可同步审查
- 形成设施清单、运维责任表和月度巡检记录
- 运营条件未落实时撤除设施，保留基本便民设施

区域协同年度行动计划

五个协同单元明确资源交换、年度动作、责任类型和成果回执

协同单元	功能分工	资源交换	年度动作	成果回执
北纬社区	AI原点社区邻里服务共测单元	提供老年人、儿童家庭、租户和小商户的日常服务问题；京张创新带提供人工智能素养、无障碍路线和人工服务工具	每年开展4次重点人群走查；完成不少于6项服务流程改进	问题清单、采纳说明、整改回执
未来科学城	生命科学、能源与工程场景协同验证节点	交换公开科研需求、评测方法和技术培训资源；京张创新带提供城市公共空间试验问题和用户反馈	每年联合发布不少于2个跨城场景题目并形成可复核原型	联合题目、测试报告、成果许可
怀柔科学城	科学装置成果公众转译与城市应用节点	引入公开科研成果、科学教育内容和仪器方法；京张创新带提供展陈、课程和公共服务转译场景	每年形成不少于2套公共科学课程和1项城市应用验证	课程包、应用记录、公众反馈
北京经济技术开发区	智能制造与机器人规模验证节点	引入智能硬件、机器人和制造供应链能力；京张创新带提供受控进行测试和服务运维需求	每年组织不少于3项设备互测和1次供应链对接	设备清单、安全报告、转化结果
京津冀协同网络	场景、标准和人才跨区域流动网络	共享公开场景需求、评测方法、课程和人才岗位；京张创新带维护统一的成果登记和退出记录	每年发布1份跨区域场景目录，组织2次联合路演，推动不少于3项成果异地验证	场景目录、活动纪要、异地验证记录

执行规则：年度协议确认后进入项目清单；统一登记来源、权利、经费、责任和退出条件。

公共人工智能服务建设运营管理

按立项、审查、测试、开放、评估五个环节明确责任单位、工作要求和成果文件

12

拟建公共服务

8

申报审查条件

60 s

人工响应目标

5个工作日

公众意见答复



服务保障

01 人工或非数字服务同步设置

02 断网停电保留实体导向

03 公众意见5个工作日答复

数据管理

01 仅采集办理所需信息

02 公开用途和保存期限

03 年度更新数据清单

安全运行

01 重大故障立即隔离

02 60秒人工响应

03 常规故障24小时内建单

监督评估


01 每月汇总故障工单

02 每季度复核服务规则

03 每年形成调整清单

分期实施计划与年度评估安排

先完成90日准备工作，再按项目成熟度推进六个项目包，并建立月度调度和年度评估制度
0-24 月建议实施窗口

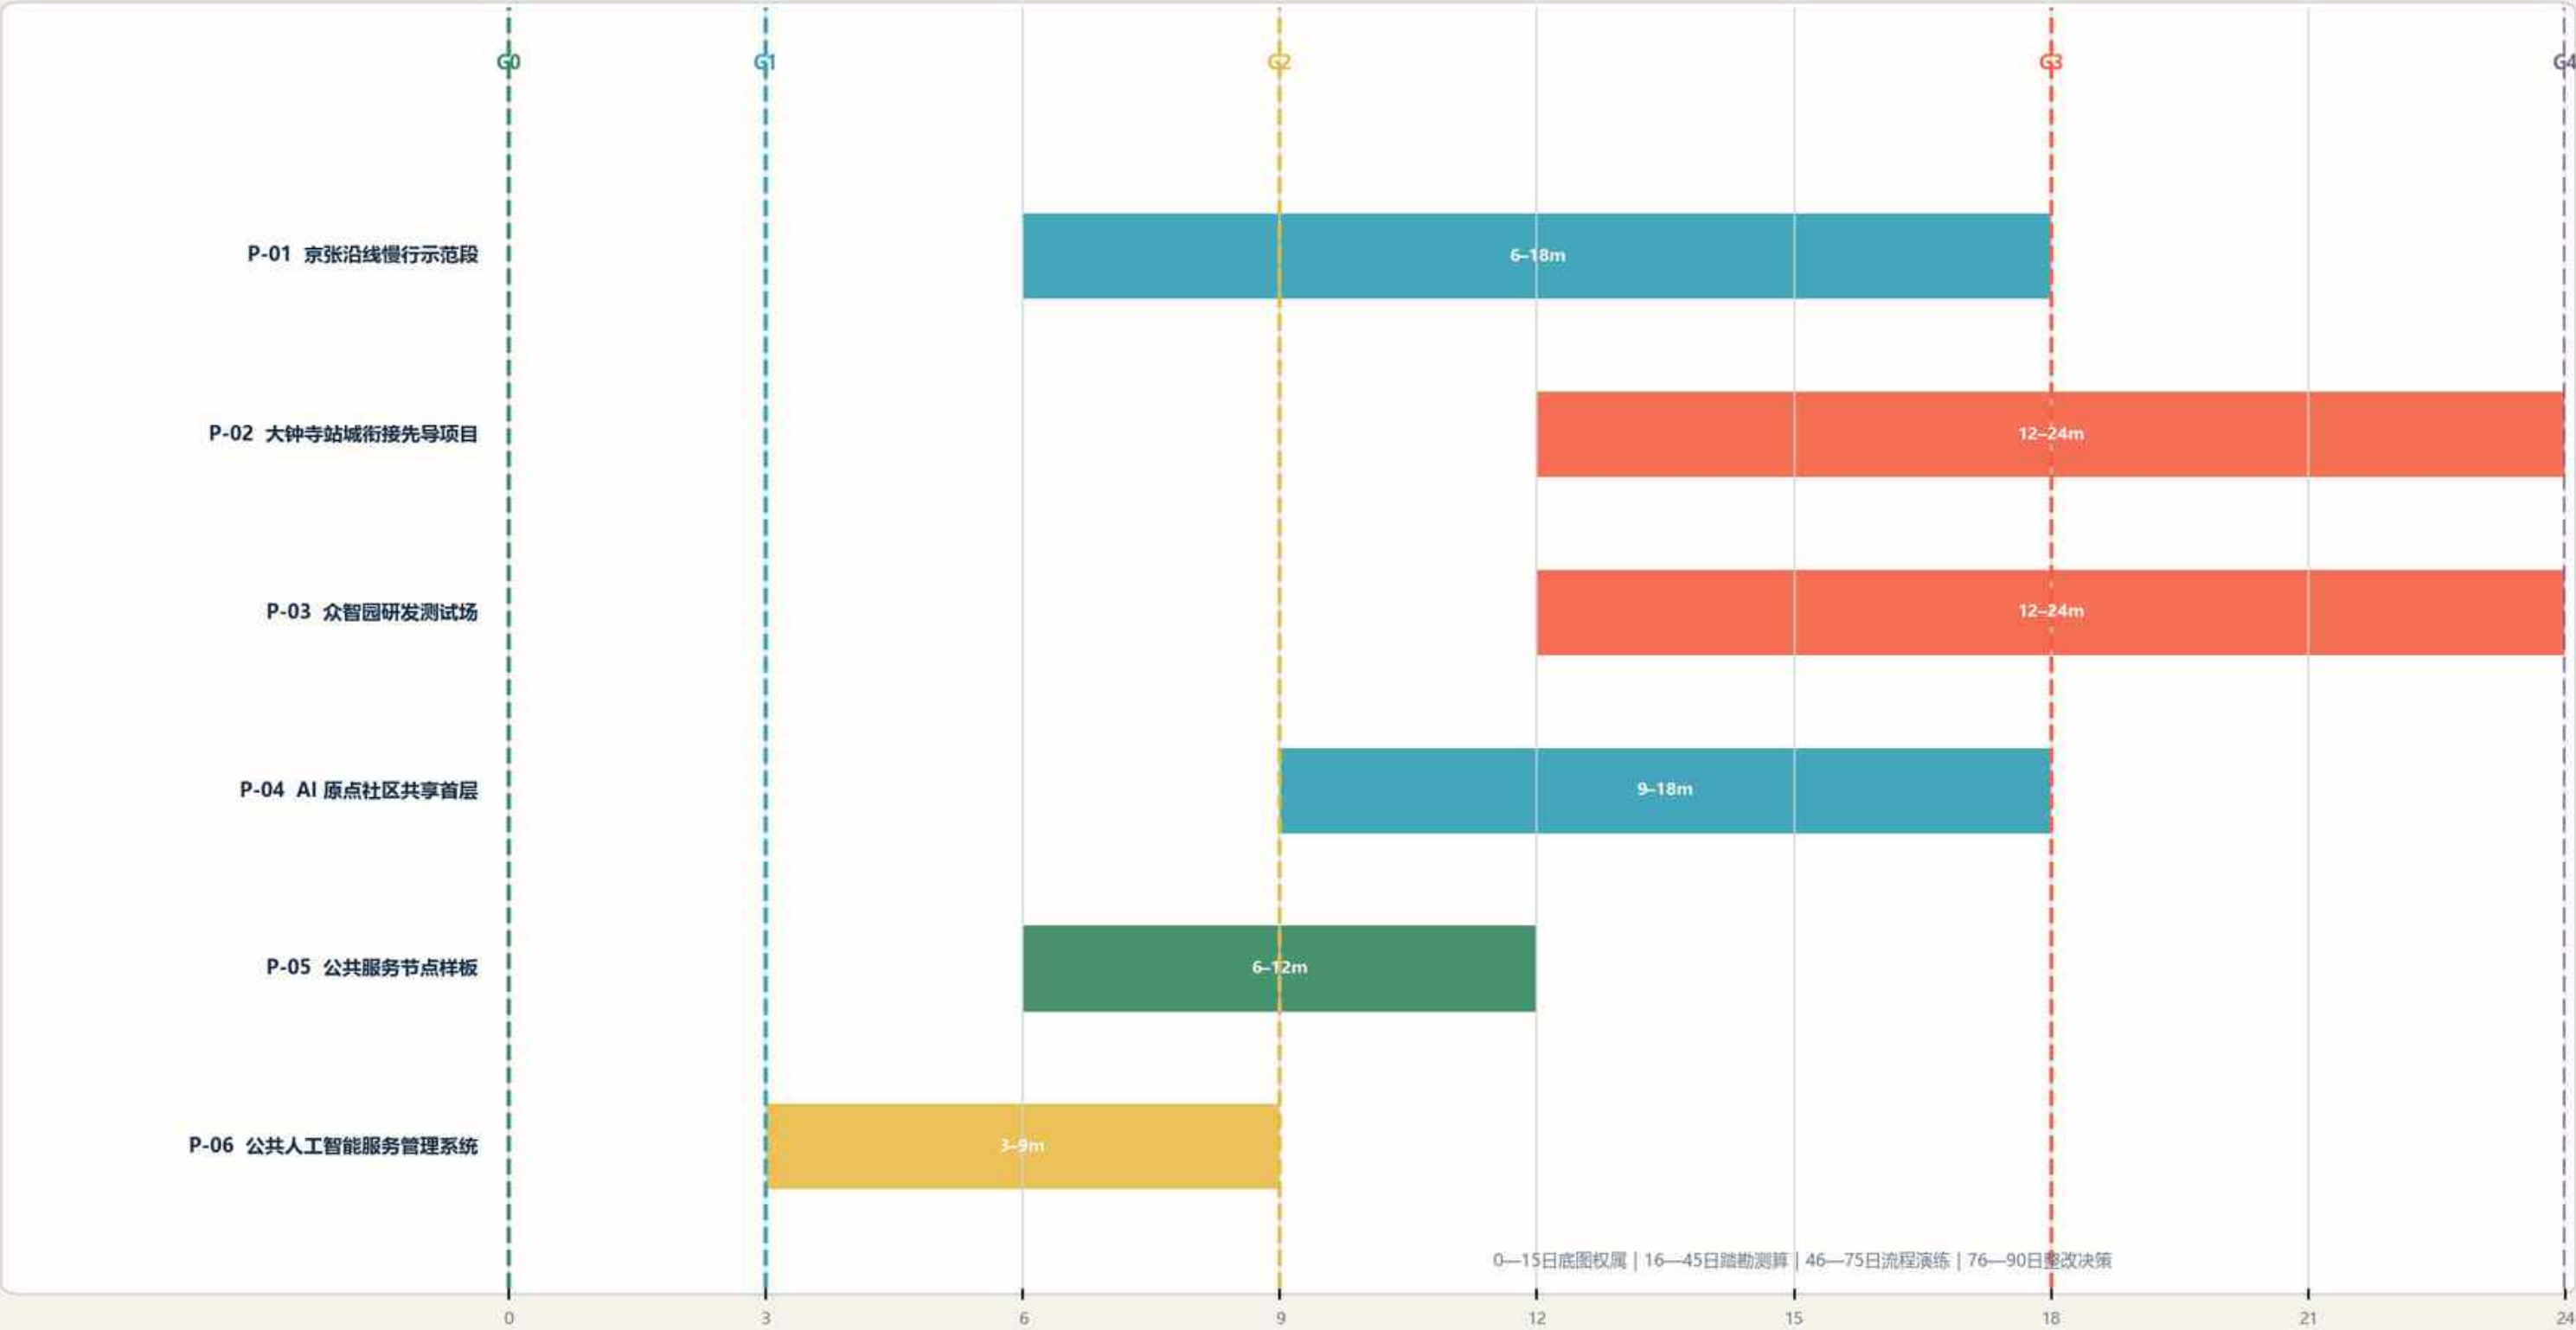

成果编制依据与资料使用说明

实行资料分类、来源登记、用途管理和成果复核，形成可持续更新的编制档案

8类

编制资料

30张

规划图件

4份

PDF成果

2套

中英文本

资料类别	来源与授权	规划用途	使用管理要求	核验状态
方案文本及译稿	本方案编制	规划说明和双语成果	重要政策、标准和事实保留来源编号	来源已登记
规划技术图件	结构化数据本地生成	空间分析、指标核算和项目表达	同步保存生成脚本、数据口径和坐标系系统	过程可复核
开放地图底图	OpenStreetMap / ODbL	区域联系与城市肌理参照	地图标注贡献者及许可信息	许可已登记
区域气候资料	NASA POWER 公开数据	2015—2024 气候基线分析	保留数据集、时间范围和计算口径	口径已登记
走廊空间模型	Blender 本地建模	城市设计意向和空间推演	纳入概念方案档案，工程深化结合测验校核	概念成型
概念场景图像	OpenAI 图像生成	公共空间氛围与使用场景表达	登记生成工具和用途，实施图纸采用专业设计成果	意向表达
离线三维展示	Three.js / MIT	方案空间关系交互浏览	随成果保留许可声明和版本信息	许可已登记
成果排版字体	系统许可字体	PDF、网页和图件排版	以嵌入方式用于成果排版	嵌入使用

法定依据

政策、标准和任务依据逐项编号并纳入来源目录

技术底图

工作底图随正式边界、测绘和现状调查动态更新

成果使用

概念图像用于表达规划意图，建设实施衔接专项设计成果

公共空间标识与导视系统指引

建立轨道门户、方向导引和服务确认三级信息体系，统一设置、使用和维护要求



京张共长线

轨道门户 · 空间导引 · 人工服务 · 夜间识别

分级设置与使用要求

形成连续、清晰、全年龄可识别的公共信息系统

一级 | 轨道门户

设置于重点片区入口和站城界面，标明项目名称与总体方向

二级 | 方向导引

设置于路径转换点，标明目的地、距离、无障碍路线和换乘信息

三级 | 服务确认

设置于服务节点，标明开放时段、人工窗口、服务状态和反馈渠道

信息与运维要求

- 项目标识与政府机关标志分区设置，保持信息边界清晰
- 人工智能服务点同步设置人工服务标识和非数字办理说明
- 公共柜用于责任提示、服务状态和停止信息，常态导引采用墨蓝与市民青
- 每月开展设施巡检，常规故障24小时内建立工单并公开状态



案例比较与人工智能创新生态

六个案例形成方法取舍，四级链条与八类要素形成年度运行制度

六个案例的采用与排除

Kendall Square 采用：众智园设置验证、知识产权和转化服务连续界面 排除：排除高租金驱动的单一办公模式，公共服务与研发空间同步配置	Paris-Saclay 采用：重点设施和公共交通实施节点同步编排 排除：排除低密外延扩张，以存量更新和公共交通可达性组织建设时序	Kalasatama 采用：所有试验纳入服务台账、人工接管和年度评估 排除：排除展示性技术项目，财政投入对应持续公共服务
Punggol Digital District 采用：建立园区、高校、社区共享的场景与设施预约机制 排除：排除封闭园区数据平台，采用分级授权和可移交接口	Barcelona Superblocks 采用：以慢行示范段带动街区公共空间连续化 排除：交通评估先行，保留消防、公交、配送和无障碍通行能力	Vienna Gender Mainstreaming 采用：项目立项前开展重点人群走查并公开意见处理 排除：儿童、老年人、残障人士和照护者分别建立需求清单

四级创新链



统一回执：编号、来源、安全评估、整改要求、转化结果

八类要素配置规则

土地 优先使用存量建筑、边角地和可逆设施，首期建设在现状用地条件内实施	空间 公共共测空间与人工服务空间同步配置，测试不得挤占基本通行和休憩
产业 按照基础模型、安全评估、智能硬件、公共服务和运维五类建立企业服务清单	资金 公共环境、试验设施和商业运营分类建账，项目建设费与三年运维费同步审查
人才 设置课程、实训、驻留和岗位四级通道，年度公布参与及就业转化结果	算力 按任务申请、分级计量，公共服务优先采用端侧或低成本推理，建设规模与年度任务负载相匹配
数据 建立来源、用途、保存期限、人工复核和删除责任五项登记，公共服务设置免个人数据办理通道	场景 场景实行公开征集、联合审查、限期试验、效果评估和退出更新

文化叙事、主题地标与荣誉体系

三条叙事进入三处日常公共设施，贡献记录实行年度复核

三条城市文化叙事

自主工程

1909—1949

京张铁路工程史、测绘方法和建设档案

开放创新

1980—2025

中关村科研创业、开源协作和产业转化

公共智能

2026—

人工智能进入公共服务的责任、权利和使用规则

三处主题地标

L-01

京张原点里程庭

北京AI原点社区

以1909、1980、2026三个时间刻度组织铁路档案、口述史和开放课程

每年更新1组口述史和1套公共课程

L-02

开放模型廊

众智园创新验证片区

展示可复现模型、测试方法、失败样例、数据来源和停止记录

每年登记不少于20项验证成果，失败案例同步公开

L-03

共治信号塔

大神寺站城公共厅

通过实体灯带和电子纸显示12项服务的开放、限流、人工接管、整改和停止状态

实时更新服务状态，每年发布1份公共服务评估

京张开放贡献档案

公共问题发现

开源工具与数据

安全与无障碍改进

长期维护


授予条件

公开成果、共同作者、可复核记录；赞助不直接形成资格。

年度活动、开发者社区与转化机制

四季日历、四个工作组和五级转化路径纳入同一年度计划

四季行动日历

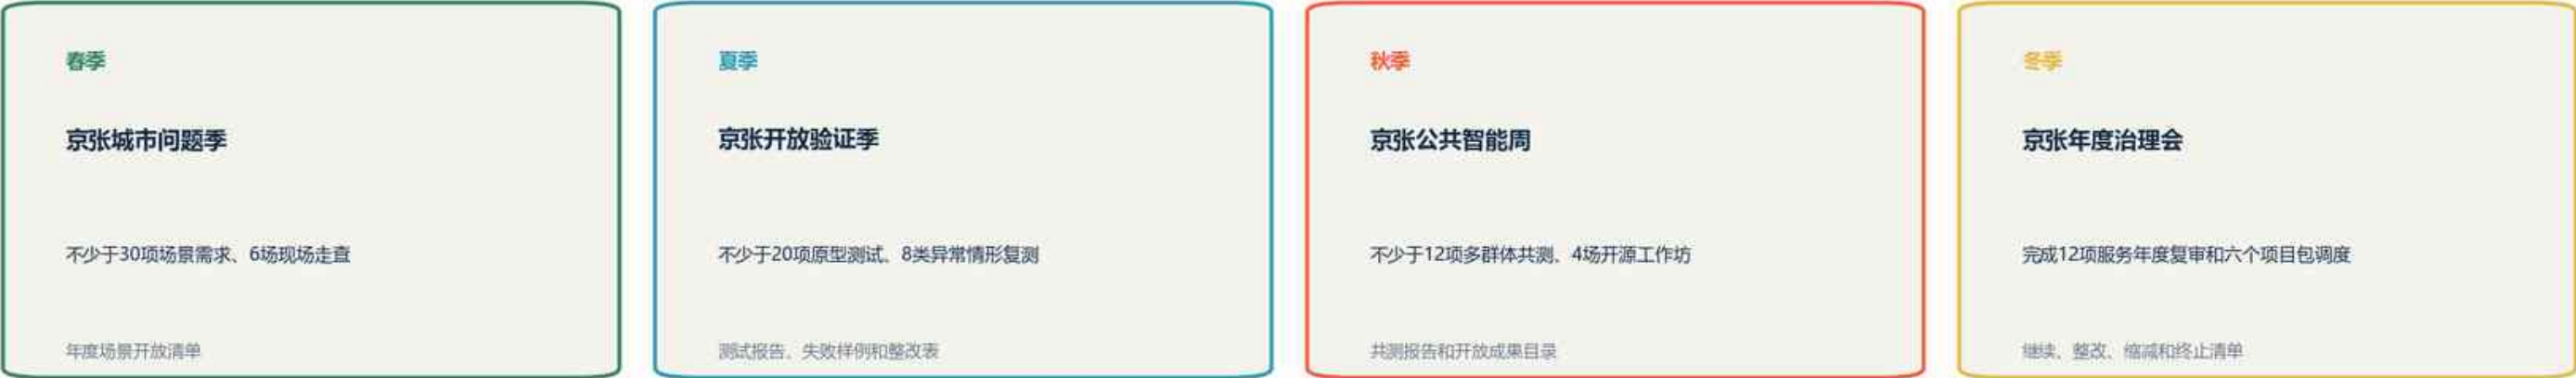

四个开发者工作组

- 01 公共服务与无障碍
 - 02 模型安全与评测
 - 03 端侧设备与机器人
 - 04 城市数据与运维
- 年度：12次开放工作日，8项可复用成果

五级成果转化路径



进入下一关口：权利清晰、成本可承担、责任落实、整改闭环。

活动、场地运维和人工服务岗位分别编制预算。
